DETAIL PRŮJEZDU AUTOBUSU KRUHOVÝM OBJEZDEM
M 1:500

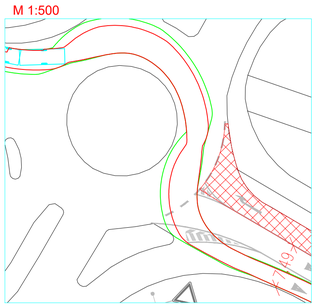

Značení v rámci akce: Most P554, Výstavní

Značení v rámci akce: Most P554, Výstavní

Značení v rámci akce: Most P554, Výstavní

Přechod pro chodce bude zachován.
Budou zajištěny rozhledy na přechodu a bude zabezpečen bezpečný průchod stavbou.
V případě nedostatečných rozhledových poměru,
bude provoz na přechodu řídit vyškolená osoba v reflexní vestě.
Na odfrézované vozovce budou u obrub použity náběhové kliny

odstup kuželů Z1 max. 2,5 m

osazeno po odfrezovani

stávající lampa není v kolizi

otočení značek

dočasný přesun zastávky BUS Sochorcova

ul. Výstavní

ul. Štichová

ul. Otlická

ul. Evaldova

ul. Klvarova

ul. Steinerova

ul. Hlavatého

ul. Kolbenkého

ul. Ke Cvičišti

IP4b stávající DZ.

A6b A15 navržené dočasné DZ.



KA - Iveca Streetway 18

Overall Length	18.750m
Overall Width	2.540m
Overall Body Height	3.425m
Min Body Ground Clearance	0.340m
Track Width	2.540m
Lock to lock time	6.00s
Wall to Wall Turning Radius	11.800m



VNA - Velky Nakladni Automobil (3 Nopravy)

Overall Length	10.100m
Overall Width	2.500m
Overall Body Height	3.800m
Min Body Ground Clearance	0.427m
Track Width	2.500m
Lock to lock time	6.00s
Wall to Wall Turning Radius	10.050m

S

zábor vozovky na pozemku 1217/1 - 1390 m^2

VYPRACOVAL:	Ing. Jozef Harčarik	CENTRAL GROUP
KONTROLOVAL:	Ing. Václav Moravec	
INVESTOR:	CENTRAL GROUP Háje a.s.	
MÍSTO STAVBY:	Praha 11, Háje / Praha 15, Petrovice	
AKCE: ÚPRAVA KŘIŽOVATKY "VÝSTAVNÍ x EXNÁROVA" Praha 11, 15		ČÍSLO ZAKÁZKY: 125
		DATUM: 10/2025
		MĚŘÍTKO: 1:1000
		STUPEŇ: DPS
OBSAH: OBNOVA POVRCHU ul. VÝSTAVNÍ DIO. - 2		PŘÍLOHA: 02
