



MVMPP 0329721

Stejnopis č. 2

## Dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo „Modernizace městského rádiového systému standardu TETRA hl. m. Prahy „

číslo objednatele: DIL/08/02/005156/2012

číslo zhotovitele: 17/VR/2012

uzavřené dne 7. prosince 2012

#### Smluvní strany

##### Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ 110 01, Česká republika  
IČO: 00064581  
DIČ: CZ 00064581  
bankovní spojení: PPF banka a.s., číslo účtu 27-5157998/6000  
zastoupené: Ing. Petrem Beranem, ředitelem odboru bezpečnosti a krizového řízení  
Magistrátu hl. m. Prahy

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

##### KonekTel, a.s.

se sídlem: Pražská 152, 530 06 Pardubice  
IČO: 15051145  
DIČ: CZ15051145  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú. 1002464321/2700  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 277,  
jejímž jménem jedná/jednají: George Joseph Grubr, předseda představenstva.

##### TELEKOMUNIKACE A SERVIS, a.s.

se sídlem: Václavské náměstí 823/33, 110 00 Praha 1  
IČO: 25911937  
DIČ: CZ25911937  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., 6762691001/5500  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 17698  
jejímž jménem jedná/jednají: Ing. Štefan Mocko, předseda představenstva společně s  
Ing. Lukáš Vondráček, místopředseda představenstva

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

na základě toho, že

Zhotovitel zaslal Objednateli Nabídku k plnění předmětu této Smlouvy ze dne 27.12.2012 a Objednatel tuto nabídku přijal, uzavírají níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1 ke Smlouvě**

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)



## Čl. I

### Změny v textu smlouvy

1. V čl. I Výkladová ustanovení se vypouští text bodu 1.6. a nahrazuje se novým textem, který zní:

„**1.6. Nabídka** – nabídka Zhotovitele podaná v otevřeném zadávacím řízení, evidenční číslo VZ: 7202011011853, k veřejné zakázce „Modernizace městského rádiového systému standardu TETRA hl. m. Prahy“ dne 28.6.2012 včetně Nabídky k plnění smlouvy o dílo č. DIL/08/02/005156/2012 a 17/VR/2012 ze dne 27.12.2012.“

2. V čl. 4 Doba plnění se vypouští text bodu 4.1. a nahrazuje se novým textem, který zní:

„4.1. Zhotovitel se zavazuje splnit předmět Díla uvedený v čl. 3.1 pod písm. a) této Smlouvy, včetně třicetidenního zkušebního provozu, nejpozději do 44 týdnů ode dne uzavření této Smlouvy dle harmonogramu postupu prací na modernizaci MRS HMP, který je přílohou č. 3 této Smlouvy.“

3. Vypouští se celý text přílohy č. 3 Podrobný harmonogram postupu prací na modernizaci MRS HMP a nahrazuje se novou přílohou č. 3, která zní:

### „Příloha č. 3

#### Podrobný harmonogram postupu prací na modernizaci MRS HMP

##### 1. Přípravné práce

Termín:	Činnost	Zodpovědný
den D	podepsání smlouvy	D + O
D + 10 týdnů	projektová dokumentace	D
D + 15 týdnů	uvolnění prostoru pro instalaci v budově Na Bojišti	D
D + 15 týdnů	příprava kabeláže v uvolněném prostoru	D
D + 24 týdnů	dodání aktuální databáze výrobcí	D
D + 25 týdnů	instalace dodané databáze do nového systému	V
D + 25 týdnů	zahájení FAT nového systému u výrobce	V
D + 26 týdnů	přeprava nového systému DIPS R8.1 do Prahy	D

##### 2. Instalace

D + 27 týdnů	instalace nového systému v budově Na Bojišti	D + V
	instalace testovací EBTS v budově Na Bojišti	D
D + 29 týdnů	oživování a testování dispečerské aplikace DP	SD
	instalace a testování dispečinků a dohledů	D + O
	příprava instalace stanic MTS4	D
	příprava řídicí jednotky PR3 na perspektivních EBTS	D

### 3. Vlastní přechod na nový systém

Zde uvedený harmonogram počítá s provedením práce v sobotu a neděli, kdy se předpokládá nižší provoz sítě. Po dohodě lze pochopitelně zvolit jiný termín.

	rozhodnutí o provedení přechodu	D + O
PÁ, do 18 h	poslední aktualizace databází v novém systému	D
PÁ, od 21 h	odpojování vybraných stanic od starého systému, připojení k novému systému, vypnuto TX	D
SO, 03 h	vypnutí vysílačů starého systému	D
	zapnutí vysílačů nového systému	D
SO, do 21 h	zkušební provoz nového systému s omezeným pokrytím a kapacitou, starý systém stále připraven k provozu	O
NE, do 03 h	odpojování zbylých stanic od starého systému, připojení k novému systému, spuštění nový systém v plném provozu	D

### 4. Závěrečné práce

	demontáž stanic EBTS/PR2	D
	vypnutí a demontáž starého řídicího systému	D
D + 40 týdnů	ukončení práce, zahájení zkušebního provozu	D + O
D + 44 týdnů	ukončení zkušebního provozu	D + O

Vysvětlivky:

O = objednatel, D = dodavatel, SD = subdodavatel, V = výrobce"

### 4. V čl. 18 se vypouští text bodu 18.9. a nahrazuje se novým textem, který zní:

„18.9. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří tato příloha:

1. Specifikace MRS HMP
2. Specifikace Ceny Díla.
3. Podrobný harmonogram postupu prací na modernizaci MRS HMP
4. Plnění požadavků zadavatele (Zhotovitelem potvrzená příloha č. 7 Zadávací dokumentace)
5. Plnění požadavků zadavatele (Zhotovitelem potvrzená příloha č. 8 Zadávací dokumentace)
6. Servisní smlouva
7. Nabídka k plnění smlouvy o dílo č. DIL/08/02/005156/2012 a 17/VR/2012

### 5. Doplňuje se nová příloha č. 7 Smlouvy, kterou je Nabídka k plnění smlouvy o dílo č. DIL/08/02/005156/2012 a 17/VR/2012, která zní:





**Hlavní město Praha**

odbor bezpečnosti a krizového řízení

Ing. Petr Beran

Mariánské nám. 2

110 01 Praha 1

**Nabídka k plnění Smlouvy o dílo č. DIL/08/02/005156/2012 a  
17/VR/2012 ze dne 7. 12. 2012**

**"Modernizace Městského rádiového systému standardu TETRA hl. m.  
Prahy"**

Vážený pane řediteli,

naše společnost s Vámi uzavřela dne 7. 12. 2012 Smlouvu o dílo na veřejnou zakázku  
"Modernizace Městského rádiového systému standardu TETRA hl. m. Prahy.

V naší nabídce ze dne 28. 6. 2012 nabízíme naše společnost technologii Motorola Dimetra IP Scalable R8.0. V současné době jsme obdrželi od výrobce informací, že od 15. 2. 2013 bude možné objednat technologii Motorola Dimetra IP Scalable ve vyšší verzi R8.1. Jedná se o verzi s inovací hardware hlavních provozních komponent, komponent přenosu dat a povinných síťových komponent. Dále došlo i k inovaci softwarové výbavy nabízené technologie v oblasti hlasových a datových služeb a interních procesů technologie.

S výrobcem technologie, společností Motorola, jsme projednali možnost dodání verze R8.1. pro plnění uzavřené smlouvy. Naše společnost garantuje splnění požadavků zadání s verzí R8.1. při zachování nabídnuté ceny.

Vzhledem k možnosti objednání nové verze infrastruktury R8.1. až 15. 2. 2013 a době výroby technologie bychom však nebyli schopni splnit sjednaný termín plnění Smlouvy o dílo uvedený v článku 4. odstavec 4.1. Plnění smlouvy o dílo s novou verzí infrastruktury R.8.1. by si vyžádalo prodloužení termínu o 9 týdnů.



Autorizovaný distributor



KonekTel, a. s., Pražská 152, 530 06 Pardubice, tel.: 466 857 111, fax: 466 857 222, e-mail: obchod@konekTel.cz, www.konekTel.cz  
IČ: 15051145, DIČ: CZ15051145, bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. číslo účtu: 1002464321/2700  
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 277



Jsme samozřejmě připraveni realizovat předmět plnění na původně nabídnuté platformě infrastruktury R8.0 ve sjednaných termínech. Domníváme se, že by bylo škoda nevyužít možnosti získat za stejných obchodních podmínek novější hardwarové vybavení, a to zejména s přihlédnutím k tomu, že k takovéto hardwarové inovaci dochází v horizontu cca. 3 let.

Pokud se vaše strana rozhodne na tuto nabídku nereflektovat, ujistujeme Vás, že všechny smluvní, záruční i pozáruční povinnosti vyplývající z plnění předmětné Smlouvy o dílo i Servisní smlouvy nebudou jakýmkoliv způsobem dotčeny.

Praha dne 27. 12. 2012



**KonekTel, a. s.**, Pražská 152, 530 06 Pardubice, tel.: 466 857 111 , fax: 466 857 222, e-mail: [obchod@konektel.cz](mailto:obchod@konektel.cz), [www.konektel.cz](http://www.konektel.cz)  
IČ: 15051145, DIČ: CZ15051145, **bankovní spojení:** UniCredit Bank Czech Republic, a.s. **číslo účtu:** 1002464321/2700  
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 277


**ČI II.**

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněny.


**ČI. III.**


1. Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatелеm, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy, případně její kopii a datum jejího podpisu. Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Praze dne 25 -01- 2013 2013



ředitel odboru bezpečnosti a krizového řízení  
Magistrátu hl. m. Prahy



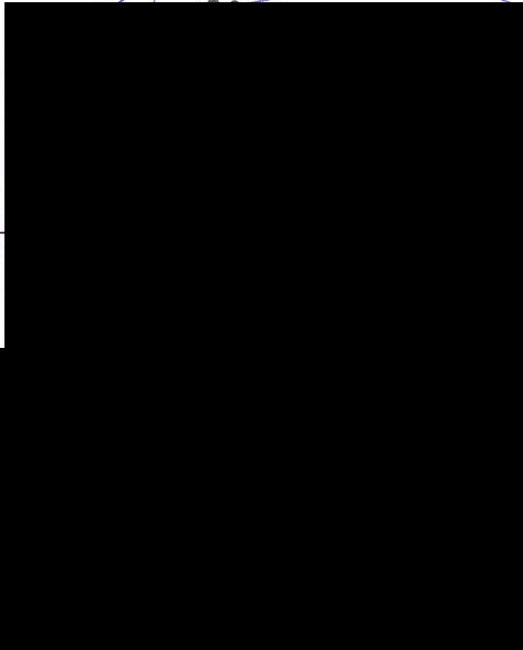

místopředseda představenstva
